

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. 10328/2017/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: ██████████
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

SLONKA s.r.o.

Sídlem podnikání: Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 26852659
DIČ: CZ26852659
Peněžní ústav: KB Ostrava, a.s.
Číslo účtu: ██████████
VS:
Zapsán: Krajský obchodní soud v Ostravě, spisová zn.: oddíl C vložka 40543
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Moravská Ostrava“. Zakázka bude realizována dle technické zprávy zpracované projekční kanceláří Ing. Vladimír Slonka se sídlem Ztracená 231, Šenov, IČ: 11193841 (příloha č. 1 smlouvy o dílo) a dle rozsahu předloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2).

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.7 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.5 Místem plnění jsou nebytové prostory ul. Nádražní 694/80, Moravská Ostrava.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.
- 2.7 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul. Nádražní 694/80, Moravská Ostrava**“ v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:
- Cena bez DPH: 238.734,- Kč
- DPH 21%: 50.134,- Kč
- Cena vč. DPH: 288.868,- Kč
- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle čl. II odst. 2.7 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.
- 3.4 O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.
- 3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je

výšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen dle výkazu výměr.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **duben 2017.**
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodloužení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v technické zprávě (příloha č. 1) a ve výkazu výměr (příloha č. 2), dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku II odst. 2.7 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:
- A) Před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, projednání s objednatelem a nájemníky, harmonogram stavby, realizace musí probíhat s ohledem na nájemníky).

B) V průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení – jedná se o obydlý bytový dům,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti a hluchnosti při realizaci prací,
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak.

C) Při převímce realizovaného díla:

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stály dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel správci domu dle svých podružných měřidel, případně dle dohodnutého paušálu,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,

- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují poříditi zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení, příloha č.3. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení správy majetku nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

žadavacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.
- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 5.17 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než sedm (7) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 5.19 O převzetí a předání díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu působivé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatel, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.
- 8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,
- k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

- 8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
- 8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě

- v článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavce 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 1.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 1.000,- Kč,

9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplacené pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavce 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X **Další ujednání**

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 500.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Článek XI **Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schváleném usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

- Příloha č.1: Technická zpráva
Příloha č.2: Výkaz výměr (krycí list, rekapitulace, položky)
Příloha č.3: Čestné prohlášení o využití poddodavatelů
Příloha č.4: Seznam kontaktů zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě, dne 19.4.2017



Ing. Petra Bernfeldová
starostka



Za zhotovitele

V Ostravě, dne 19.4.2017



Ing. Vladimír Slonka
jednatel

SLOVKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 25852659

**NÁDRAŽNÍ 80
VÝMĚNA VÝKLADCŮ**

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA



ING. VLADIMÍR SLONKA
Ztracená 231
739 34 Šenov


ÚNOR 2017

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

ZADAVATEL: Statutární město Ostrava,
MObv. Moravská Ostrava a Přívoz
nám.Dr.E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

NÁZEV AKCE : „Nádražní 80 – výměna výkladců“

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :



VYPRACOVAL :

PROJEKTANT STAVBY :

Ing.Vladimír SLONKA



OBSAH

1. Úvod	4
• předmět projektové dokumentace	4
• cíl projektové dokumentace	4
2. Základní údaje	4
• Identifikace objektu	4
• přehled výchozích údajů	5
3. Současný stav	5
• svislé obvodové konstrukce	5
• vodorovné konstrukce	5
• podlahy	5
• úprava povrchů	5
○ vnitřní omítky v prodejně	5
○ vnější omítky	5
• výplně otvorů	5
• dotčené instalace	6
○ elektroinstalace	6
○ topení	6
4. Navrhovaný stav	6
• viz. projektová dokumentace	6
5. Skutečné provedení	6
• svislé konstrukce	6
• vodorovné konstrukce	6
• podlahy	6
• úpravy povrchů	6
○ vnější omítky	6
○ vnitřní omítky v prodejně	7
• výplně otvorů	7
• dotčené instalace	7
○ elektroinstalace	7
○ topení	7
6. Nakládání s odpady	7

1. ÚVOD

PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Předmětem projektové dokumentace je demontáž a výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné či hliníkové.(dle objednatele)

CÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKACE OBJEKTU

Stavba: č.p. 694

Obec: Ostrava [554821]

Část obce: Moravská Ostrava [413950]

Katastrální území: Moravská Ostrava [713520]

Číslo LV: 7424

Na parcele: 1252/7

Typ stavby: budova s číslem popisným

Způsob využití: objekt k bydlení

Jednotky v budově: 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 694/901, 694/902

Dotčený objekt se nachází v centru města v uliční zástavbě na ulici Nádražní, v památkové zóně. Jedná se o bytový dům, jednotky 2 - 5 ve vlastnictví soukromých vlastníků, jednotka 694/901 a 694/902 sloužící jako prodejny, ve vlastnictví SMO.

Úpravy se dotknou pouze části 1.NP, ve které je bývalá provozovna obchodu s potravinami.

Budova je postavena v tradiční cihelné technologii.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH ÚDAJŮ

- Zaměření stávajícího stavu projektantem
- Fotodokumentace
- Prohlídka se zástupcem SMO

3. SOUČASNÝ STAV

SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci domu tvoří zděné stěny, po obvodu tloušťky 450mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Strop v interiéru je řešen pomocí SDK podhledu ve výšce 2800 mm nad podlahou a je v celé ploše místnosti.

PODLAHY

Podlaha v prodejní části je z keramické dlažby.

ÚPRAVA POVRCHŮ

Vnitřní omítky v prodejně

Stávající omítky stěn a stropů jsou hladké štukové. V místech mezi výkladci je povrch řešen pomocí dřevěných prken a fošen. Na spodním parapetu je koberec. Strop je snížen pomocí SDK podhledu.

Vnější omítky

Celá fasáda parteru od soklíku z umělého kamene po římsu mezi 1. a 2. NP je řešena omítkou a malbou ve světle oranžové barvě.

VÝPLNĚ OTVORŮ

V prodejnách jsou staré dřevěné výkladce z venkovní i vnitřní strany zasklené jednoduchým sklem do dřevěného rámu.

Výkladec se vstupními dveřmi je z poloviny otevíravý. Druhý výkladec je otevíravý v 1/3 svého dělení. (viz. výkresová dokumentace)

Druhý výkladec je z vnitřní strany opatřen ochranou ocelovou mříží. Ochrannou mříží, situovanou z venkovní strany je zabezpečen i hlavní vstup do prodejny.

Pod výkladcem se vstupními dveřmi je ve fasádě mřížka z drátěného pletiva, která kryje sklepní okénko s nepoužívaným shozem otopu.

U hlavního vstupu do prodejny je situováno vstupní vyrovnávací schodiště o počtu stupňů dva výšky 170 mm a rozdílných šířek stupnic.

DOTČENÉ INSTALACE

Elektroinstalace

U výkladce bez vstupních dveří se nachází mezi vnějším a vnitřním výkladcem zářivka napojena na elektroinstalaci k ní vedenou.

Topení

Zůstává beze změn.

4. NAVRHOVANÝ STAV

Viz. Projektová dokumentace.

5. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

SVISLÉ KONSTRUKCE

Do nosných konstrukcí se nezasahovalo.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Nedošlo k dotčení.

PODLAHY

K dotčení podlahy dojde jen v případě zvětšení délky zapuštění vstupních dveří směrem do interiéru. Tím dojde ke zvýšení délky a plochy druhého stupnice (na 600 mm). Celé vstupní schodiště bude opraveno za pomoci protiskluzové a mrazuvzdorné keramické dlažby a to včetně stupnice a podstupnice.

ÚPRAVA POVRCHŮ

Vnější omítky

Vnější omítky budou sanovány, nesoudržné části oklepány a místa zpětně omítnuty.

Vnitřní omítky v prodejně

Vnitřní štukové omítky v prodejnách byly dotčeny výměnou výkladců. Byly proto po odstranění výkladových skříní otlučeny i kolem výkladců na dotčených plochách, zdivo bylo vyrovnáno a provedly se nové štukové omítky s vymalováním bílou barvou (jen dotčené stěny).

VÝPLNĚ OTVORŮ

Výkladce

Stávající výkladce jsou vyměněny za nové dřevěné z masivu dub, zasklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem s rámečkem se zlepšenou tepelnou izolací v hnědé barvě. Tvar výkladců viz. pohledy a tabulky PSV. Dřevěné konstrukce výplní jsou natřeny kvalitním ochranným lazurovacím nátěrem včetně důkladné penetrace dřeva.

Vstupní dveře jsou ze 2/3 prosklené(viz.pohled) – zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem s rámečkem se zlepšenou tepelnou izolací v hnědé barvě, opatřené nerezovým matným madlem, cylindrickým zámkem, přídatným zámkem a zámkem s vratnou pružinou. Na dveřích je instalován samozavírač a panty s bezpečnostní ochranou proti vysazení s krytem.

Vzhledem k tomu, že nový vstup do provozovny je zapuštěn směrem do interiéru, je zapotřebí přidat i další výklad, ten bude kolmý na rám hlavních vstupních dveří(viz.Řez 1-1' a výpis PSV). Nadpraží zapuštěných vstupních dveří bude zakryto dřevěnými deskami spojenými na pero a drážku(viz.Řez 1-1').

Před výrobou výkladců bude dodavatelem zpracována výrobní dokumentace.

DOTČENÉ INSTALACE

Elektroinstalace

Veškerá elektroinstalační vedení zasahující do výkladců se demontovalo, spínače a ovladače reklam byly osazeny do stěny v blízkosti výkladců. Stávající reklamy byly odstraněny.

Topení


V prodejně pod vnitřními výkladci je situováno topení, které bude ponecháno, popřípadě opatřeno novým nátěrem.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Staveništní suť z prováděných prací bude přímo odvážena na řízené skládky na území Ostravy a bude s ní naloženo dle zákona.

PROJEKT

PROJEKT ŘEŠÍ VÝMĚNU VÝPLNĚ V NEBYTOVÝCH PROSTOŘECH.
STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ VÝPLNĚ ZASKLENÉ JEDNÍM SKLEM V DŘEVĚNÉM RAMU
BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝPLNĚMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU NEBO HLINSKU
ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
INVESTOR		
SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 30		
AKCE	NÁDRAŽNÍ 694/80 - VÝMĚNA VÝKLADCŮ	FORMÁT 1x A4
MÍSTO	par.č. 1252/7, k. ú. Moravská Ostrava [713520]	DATUM 02/2017
OBSAH	VÝPISY PSV	STUPEŇ DSP, DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
		VÝKRES Č. 05
		ZAK.Č. 1703

VÝKLADCE

LIST č. : 1

AKCE : VÝMĚNA VÝKLADCŮ – NÁDRAŽNÍ 80
 OBJEKT : BYTOVÝ DŮM
 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1703



OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA	CELKEM KS
1		3180x3000	NOSNÁ K-CE (RÁMY) DŘEVĚNÁ POPŘ.KOVOVÁ (AL) VEL.2210x2100mm,VÝPLŇ VÝKLADCE PEVNÁ PROSKLENÁ SKLAPĚCÍ NADSVĚTLÍK 2210x900mm PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK 970x900mm VNITŘNÍ PARAPET 	VIZ. SOUHRNNÝ POPIS VÝROBKU bezpečnostní sklo	STŘEDNĚ HNĚDÁ LAZURA	1
2		3180x3000	NOSNÁ K-CE (RÁMY) DŘEVĚNÁ VEL.3180x2100mm,VÝPLŇ VÝKLADCE PEVNÁ PROSKLENÁ SKLAPĚCÍ NADSVĚTLÍKY 2x 1590x900mm VNITŘNÍ PARAPET 	VIZ. SOUHRNNÝ POPIS VÝROBKU bezpečnostní sklo	STŘEDNĚ HNĚDÁ LAZURA	1

AKCE : VYMEŇENA VYKLADCŮ – NADRAŽNÍ 80
 OBJEKT : BYTOVÝ DŮM
 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1703

VYKLADCE

VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY

LST č.: 2

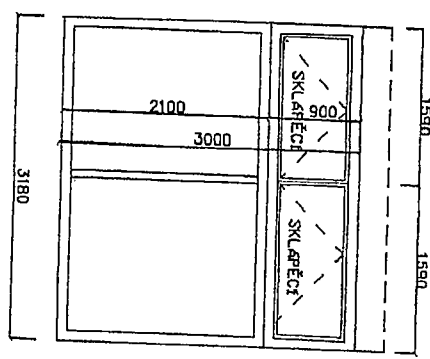
OZN.	SCHEMA	ROZMĚR(mm)	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA	CELKEM KS
2			<p>NOSNÁ K-CE (RÁMY) KOVONÁ (AL) VEL. 3180x2100mm, VÝPLŇ VYKLADCE PEVNÁ PROSKLENÁ SKLAPĚČI MADSVĚTLIKY 2x 1590x900mm VITŘNÍ PARAPET</p>	<p>VIZ. SOUHRNNÝ POPIS VÝROBKU</p> <p>bezpečnostní sklo</p>	<p>STŘEDNĚ HNĚDÁ RAL</p>	1
3		800x2100	<p>NOSNÁ K-CE (RÁMY) DŘEVĚNÁ POPŘ. KOVONÁ (AL) VÝPLŇ VYKLADCE PEVNÁ PROSKLENÁ BOČNÍ VYKLAD U ZAPUŠTĚNÉHO VSTUPU</p>	<p>VIZ. SOUHRNNÝ POPIS VÝROBKU</p> <p>bezpečnostní sklo</p>	<p>STŘEDNĚ HNĚDÁ LAZURA RAL</p>	1

AKCE : VYMĚNA VYKLADCŮ – NADPRAŽNÍ 80
 OBJEKT : BYTOVÝ DŮM
 ZAKAZKOVÉ ČÍSLO : 1703


VEŠKÉRE ROZMĚRY OVERTI NA MÍSTĚ STAVBY

VYKLADCE


LIST č : **3**

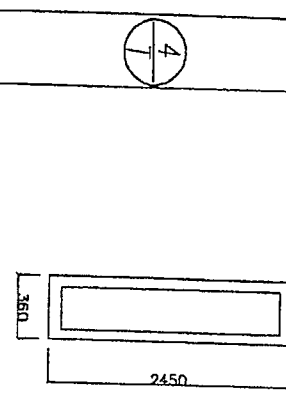OZN.	SCHEMA	ROZMĚR(mm)	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA	CELKEM KS
		360x2450	NOSNÁ K-CE (RAMY) DŘEVĚNÁ POPŘ.KOVOVÁ (AL) VÝPLŇ VYKLADCE PEVNÁ PROSKLENÁ BOČNÍ VYKLAD U ZAPUŠTĚNÉHO VSTUPU	VIZ. SOUHRNNÝ POPIS VÝROBKU bezpečnostní sklo	STŘEDNĚ HNĚDÁ LÁZURA RAL	1

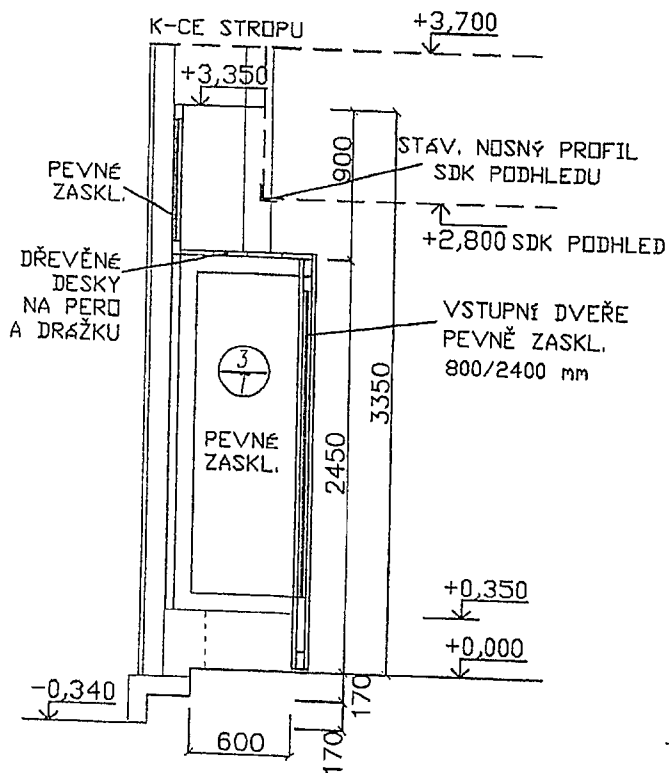


VÝKLADCE - NOVÝ STAV - ŘEZ 1-1'

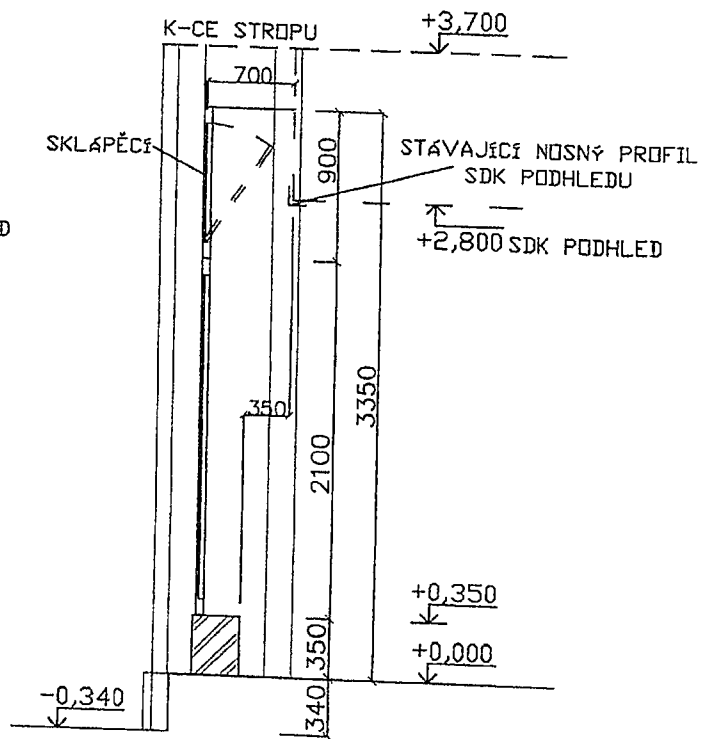


VÝKLADCE - NOVÝ STAV - ŘEZ 2-2' A 3-3'




LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE


PROJEKT ŘEŠÍ VÝMĚNU VÝPLNĚ V NEBYTOVÝCH PROSTOŘECH.
 STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ VÝPLNĚ ZASKLENÉ JEDNÍM SKLEM V DŘEVĚNÉM RAMU
 BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝPLNĚMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU NEBO HLINIKU
 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 30		
AKCE	NÁDRAŽNÍ 694/80 - VÝMĚNA VÝKLADCŮ	
MÍSTO	par.č. 1252/7, k. ú. Moravská Ostrava [713520]	FORMÁT 1x A4
OBSAH	VÝKLADCE - NOVÝ STAV - ŘEZY	DATUM 02/2017
		STUPEŇ DSP, DPS
		MĚŘITKO 1:50
		VÝKRES Č. 04
		ZAK.Č. 1703

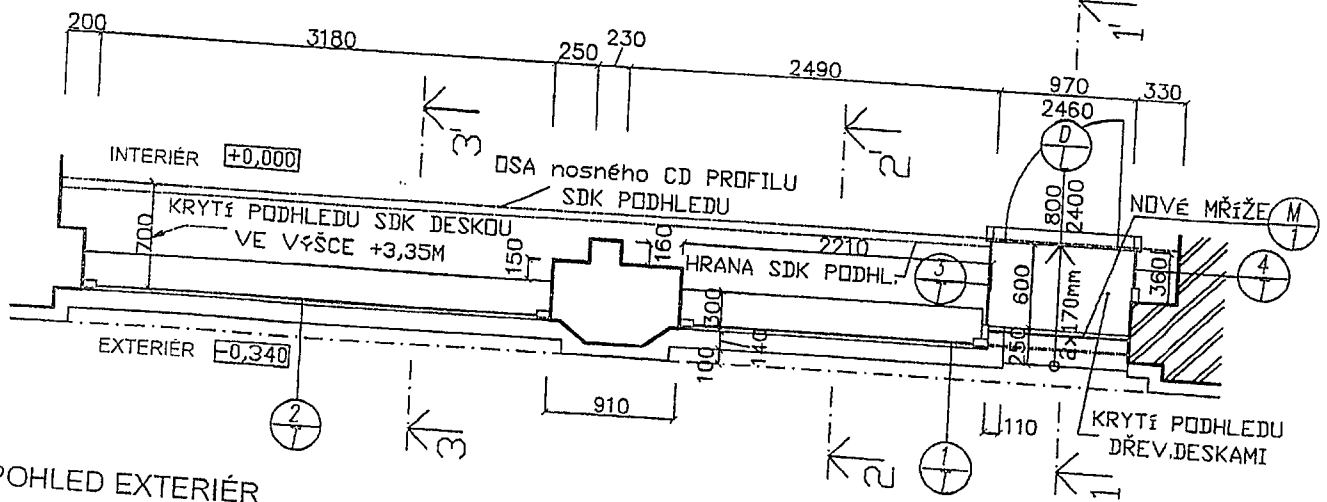


VÝKLADCE - NOVÝ STAV - PŮDORYS

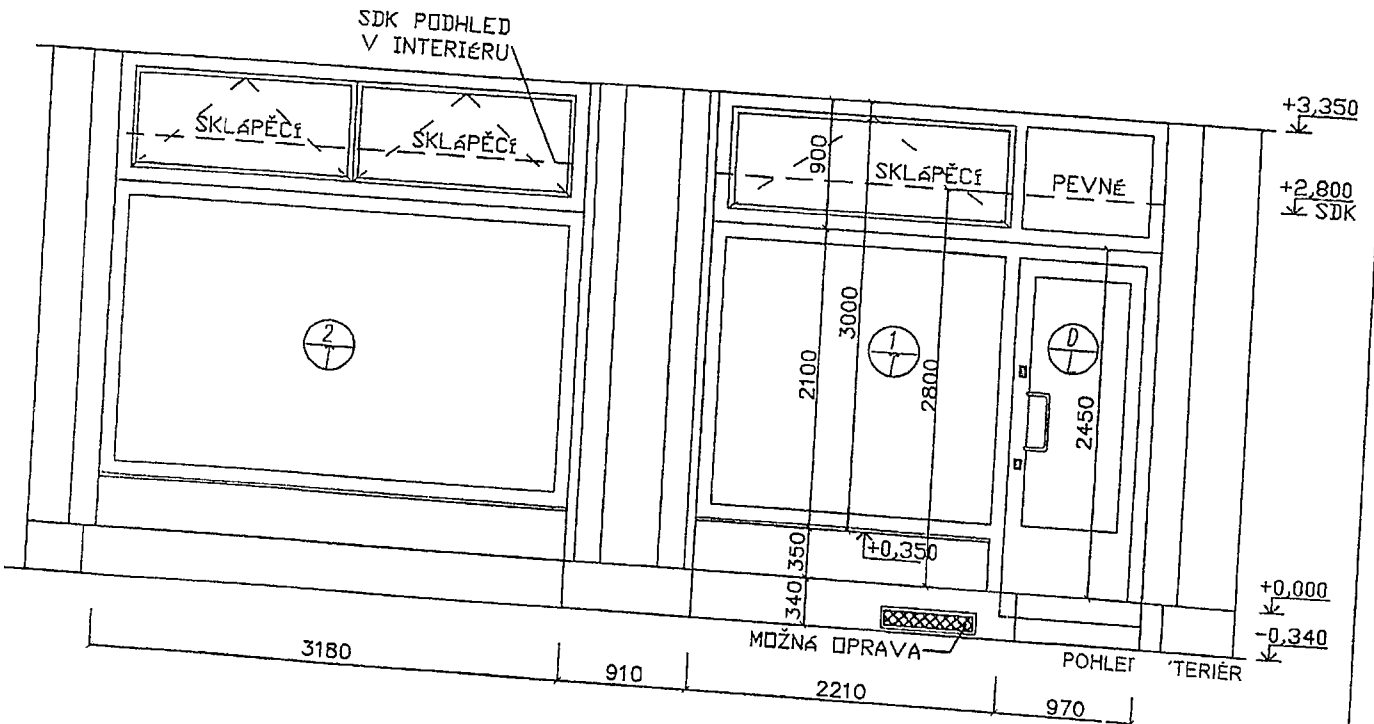


POHLED EXTERIÉR




LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE


PROJEKT ŘEŠÍ VÝMĚNU VÝPLNĚ V NEBYTOVÝCH PROSTOŘECH.
 STÁVAJÍCÍ DVOJITĚ VÝPLNĚ ZASKLENÉ JEDNÍM SKLEM V DŘEVĚNÉM RAMU
 BUDDU NAHRAZENY NOVÝMI VÝPLNĚMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU NEBO HLINÍKU
 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
INVESTOR	SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 30	
AKCE	NÁDRAŽNÍ 694/80 - VÝMĚNA VÝKLADCŮ	
MÍSTO	par.č. 1252/7, k. ú. Moravská Ostrava [713520]	FORMÁT 1x A4
OBSAH	VÝKLADCE - NOVÝ STAV - PŮDORYS A POHLED	DATUM 02/2017
		STUPEŇ DSP, DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
		VÝKRES Č. 03
		ZAK.Č. 1703

VÝKLADCE - NÁDRAŽNÍ 80 - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE - Z EXTERIÉRU

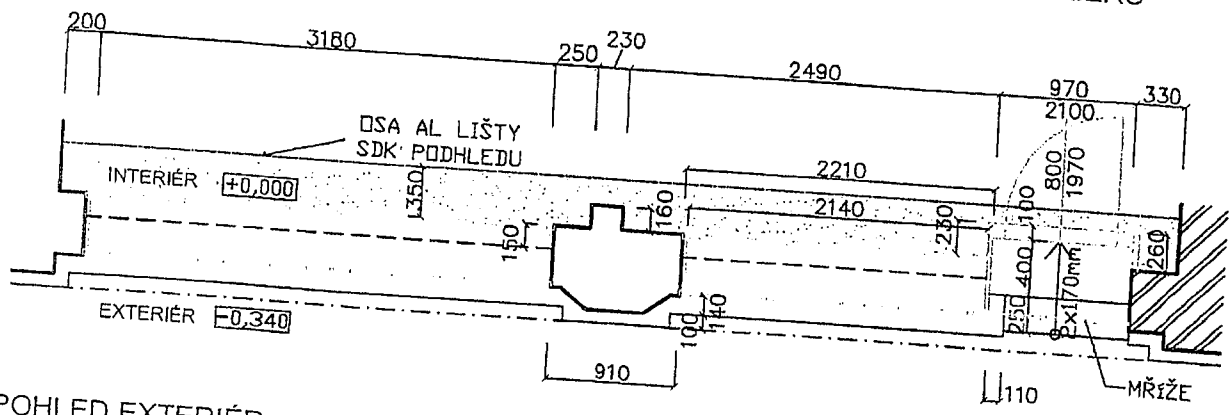

POHLED EXTERIÉR

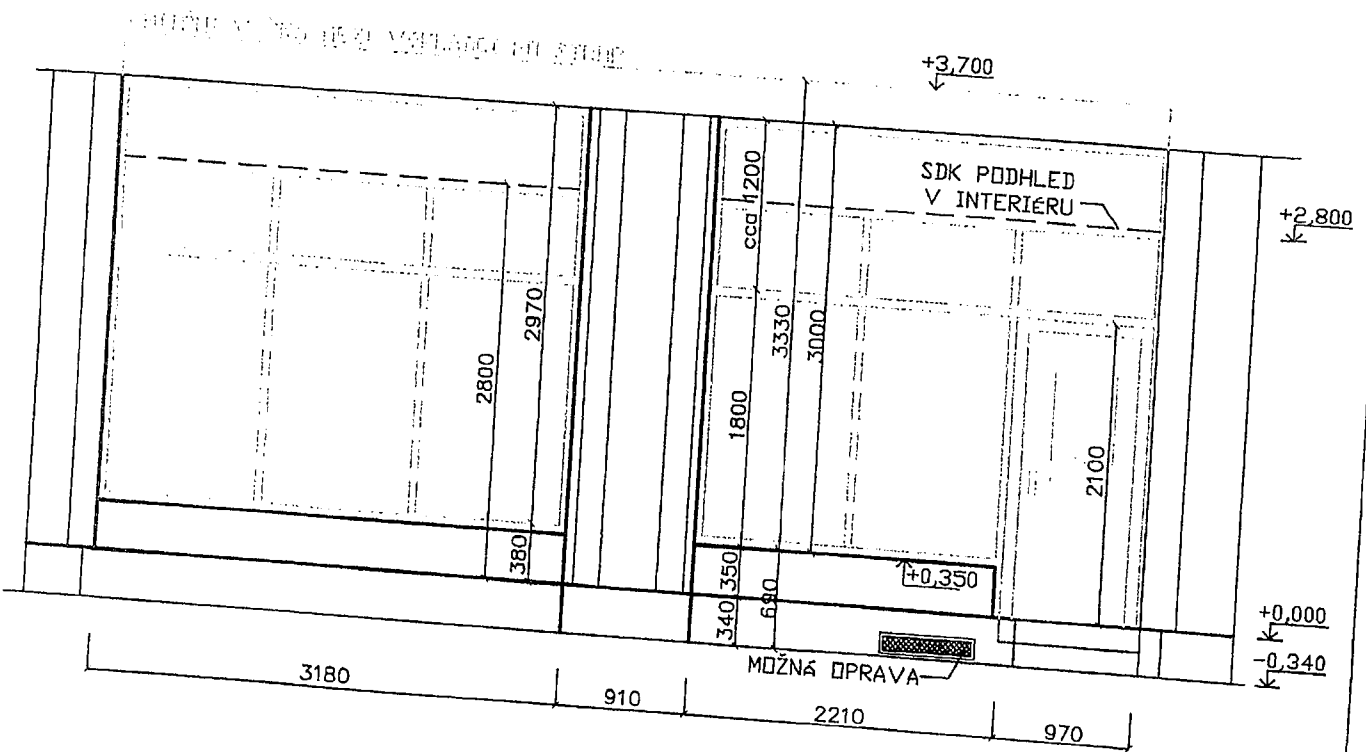

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OCHRANA PŘES OHRAZU
- DOSTUPNÝ ČÍSLO NOVĚ PŘÍBĚH

PROJEKT ŘEŠÍ VÝMĚNU VÝPLNÍ V NEBYTOVÝCH PROSTOŘECH. STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ VÝPLNĚ ZASKLENÉ JEDNÍM SKLEM V DŘEVĚNÉM RAMU BUDDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝPLNĚMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU NEBO HLINÍKEM ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
INVESTOR	SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 30			
AKCE	NÁDRAŽNÍ 694/80 - VÝMĚNA VÝKLADCŮ			
MÍSTO	par.č. 1252/7, k. ú. Moravská Ostrava [713520]			
OBSAH	VÝKLADCE - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		FORMÁT	1x A4
			DATUM	02/2017
			STUPEŇ	DSP, DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			VÝKRES Č.	01
			ZAK.Č.	1703

VÝKLADCE - NÁDRAŽNÍ 80 - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE - Z INTERIÉRU


POHLED INTERIÉR

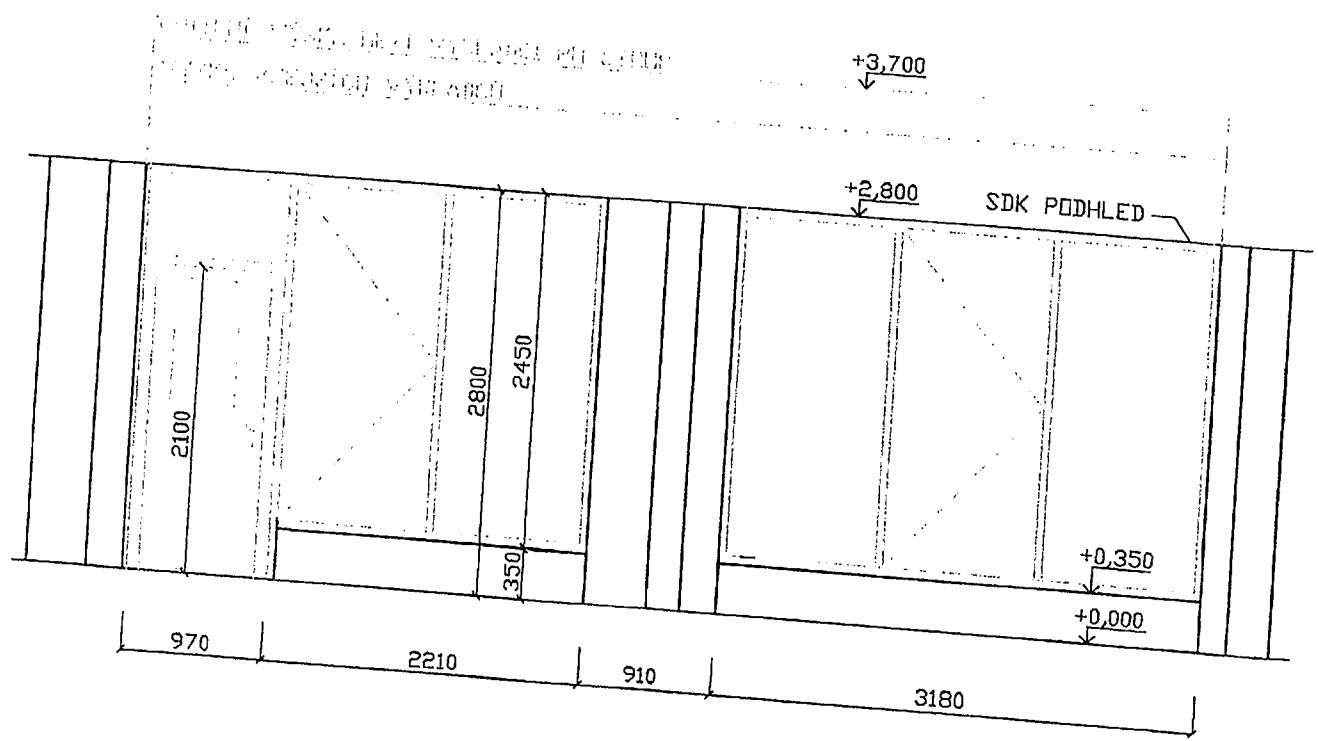

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PROJEKT ŘEŠÍ VÝMĚNU VÝPLNÍ V NEBYTOVÝCH PROSTOŘECH. STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ VÝPLNĚ ZASKLENÉ JEDNÍM SKLEM V DŘEVĚNÉM RÁMU BUDDOU NAHRAZENY NOVÝMI VÝPLNĚMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU NEBO HLINÍKU ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
INVESTOR SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 30		
AKCE NÁDRAŽNÍ 694/80 - VÝMĚNA VÝKl.ADCŮ		
MÍSTO par.č. 1252/7, k. ú. Moravská Ostrava [713520]	FORMÁT 1x A4	DATUM 02/2017
OBSAH VÝKLADCE - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	STUPEŇ DSP, DPS	MĚŘITKO 1:50
	VÝKRES Č. 02	ZAK.Č. 1702

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt : 1	Název objektu : Výměna vykladců - dřevěné	JKSO :
Stavba : P	Název stavby : Nádražní 80	SKP :
Projektant :		
Objednatel :	Počet měrných jednotek :	0
Počet listů :	Náklady na MJ :	0
Zpracovatel projektu :	Zakázkové číslo :	
	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0,00	Zařízení staveniště
Z Montáž celkem	800,00	Provoz investora
R HSV celkem	35 325,06	
N PSV celkem	202 608,57	
ZRN celkem	238 733,63	
HZS	0,00	
RN II. a III. hlavy	238 733,63	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	238 733,63	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	SLONKA s.r.o. Nádražní 20 702 00 Ostrava DIČ: CZ 26852659	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	238 733,63 Kč
DPH	21,0 % činí :	50 134,06 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		288 867,70 Kč

Poznámka :

Stavba :	P Nádražní 80	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Výměna výkladců - dřevěné	Stavební část - Dřevěné II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	9 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Upravy povrchů vnější	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	1 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7631 Konstrukce sádkartonové	0,00	9 245,27	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	183 397,21	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	3 912,72	0,00	0,00	0,00
773 Podlahy teracové	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	3 097,65	0,00	0,00	0,00
787 Zasklívání	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 959,42	0,00	0,00	800,00	0,00
CELKEM OBJEKT	35 325,06	202 608,57	0,00	800,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	M	Kč	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0	0,0	238 733,63
Provoz investora		0	0,0	0
CELKEM VRN		0	0,0	238 733,63
				0

ový rozpočet

Příloha č.2 smlouvy

Stavba : **P Nádražní 80**
 Objekt : **1 Výměna výkladců - dřevěné**

Rozpočet: 1
 Stavební část - Dřevěné II

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	319202321R00	Svislé a kompletní konstrukce Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm (3+3,35+0,4)*0,6 (2*3)*0,6	m2	7,65 4,05	180,00	1 377,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 377,00
Díl: 61	610991111R00	Upravy povrchů vnitřní Zakrývání výplní vnitřních otvorů 3,35*3,18	m2	20,19	20,00	403,86
3	612409991R00	3*3,18 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (3,35+3,18)*2	m	9,54 25,42	35,00	889,70
4	612425931R00	(3+3,18)*2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Začátek provozního součtu (3,35+3,18)*2 (3+3,18)*2 Konec provozního součtu 25,42*0,9	m2	12,36 22,88 13,06 12,36 25,42 22,88	350,00	8 007,30
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						9 300,86
Díl: 62	622903110U00	Upravy povrchů vnější Mytí omítek slož 1-2 tlak.vodou otlučené plochy: 45 756	m2	45,76	32,00	1 464,19
6	620471812U00	Nátěr základní pen	m2	45,95	21,00	964,87
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,19	23,00	464,44
8	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 kolem výkladců běžová, soklík sv. šedá: š.1m po obvodu výkladců: (3,35+3,2)*2*2*1	m2	26,20	45,00	1 179,00
9	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 vnější strana ostění:22,878	m2	26,20 22,88 22,88	250,00	5 719,50
Celkem za 62 Upravy povrchů vnější						9 792,00
Díl: 63	631311121R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 1*1*0,05	m3	0,05	2 140,00	107,00
11	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod vnitřní parapety:(3,18+2,21)*0,5 pod stupně:1*2	m2	0,05 6,70 2,70	195,00	1 305,53
12	L	podesta a podlaha u vstupu:2 D + M přechodové lišty stará a nová podlaha u vstupu - přechod:2	bm	2,00 2,00 2,00	250,00	500,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 912,53
Díl: 94	941955003R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (3,2+0,91+2,21+0,97+2*1)*2	m2	18,58 18,58	94,00	1 746,52
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 746,52
Díl: 95	952901111R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m venkovní i vnitřní strana 3m od výkladců: (3,2+0,91+2,21+0,97)*2*2	m2	29,16 29,16	50,00	1 458,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						1 458,00
Díl: 96	965043321R00	Bourání konstrukcí Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 podesta a schodiště vstupu: 1*1,5*0,05	m3	0,22	3 000,00	666,60
16	967031132R00	srovnání pod parapety:2,695*0,05 nerovnosti na schodech:1*0,25*0,05		0,08 0,13		
17	968061113R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC Vyvážení dřevěných křidel pl. nad 1,5 m2 vstup do výloh:2	m2 kus	0,01 10,20 3,00	65,00 10,00	663,00

ový rozpočet

Příloha č.2 smlouvy

Stavba :	P Nádražní 80	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Výměna výkladců - dřevěné	Stavební část - Dřevěné II

č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
18	968062247R00	dveře:1 Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. nad 4 m2 (0,97+2,21)*3,35*2	m2	1,00 40,39	40,00	1 615,44
		3*3,18*2		21,31		
19	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů (3*2+3,18)*0,6	m2	19,08 11,59	100,00	1 158,60
		(3+2,21+0,97+3,35+0,6)*0,6		5,51		
20	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % vnitřní ostění:22,878	m2	6,08 45,76	19,00	869,36
		venkovní ostění:22,878		22,88		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí		22,88		
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 003,00
21	r-pol	Odstranění reklam a konzol	kpl	1,00	500,00	500,00
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				500,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,25	300,00	1 275,74
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 275,74
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				1 275,74
23	763111281U00	Montáž nosné SDK konstrukce vč. dodávky profilů úprava SDK u horní části výkladů:	m2	7,65	560,00	4 284,00
		(0,2+3,18+0,25+0,23+2,49+0,97+0,33)*1		7,65		
24	763111282U00	Montáž desek SDK tl.12,5mm vč. dodávky desek	m2	7,65	150,00	1 147,50
25	DM	Odřezání SDK konstrukce pro nové napojení	m	7,65	105,00	803,25
26	R	0,2+3,18+0,25+0,23+2,49+0,97+0,33		7,65		
27	UP	Příplatek za malý rozsah SDK prací	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
		Úprava SDK kce pro novou konstrukci nové příkrovení do stropu				
28	998763301U00	Přesun t SDK kce objekt v -6m	m	7,65	210,00	1 606,50
		Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové	t	0,01	500,00	4,02
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				9 245,27
29	1/T	Dřevěný výkladec s dveřmi nadsvětlíkem 221*300+97*335 vč. boků 3a4/T	kus	1,00	93 500,00	93 500,00
30	2/T	Dřevěný výkladec s dveřmi a nadsvětlíkem 318/300	kus	1,00	58 700,00	58 700,00
31	P	Parapet vnitřní k výkladům š. do 50 cm 3,18+2,49	m	5,67	420,00	2 381,40
32	DD	Zpracování a odsouhlasení dílenské dokumentace		5,67		
33	Montáž	Montáž dřevěných výkladců vč. osazení parapetů D+M vnitřní parotěs. a vnější exp. těsnící pásy	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
34	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské	%	1 815,81	1,00	1 815,81
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				183 397,21
35	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm obklad schodiště bez dodávky dlažby vč. podstup. 2	m2	2,00	400,00	800,00
36	r-pol	Soklování schodiště a podesty kolem schodiště:4	bm	4,00	400,00	1 600,00
37	r-pol	Protiskluzová dlažba mrazuvzdorná (2+4*0,15)*1,2	m2	3,12	200,00	624,00
38	r-pol	Spárování dlažby		3,12		
39	r-pol	Příplatek za schodovku 30x30 protiskluz, mrazuvzdorná	m2	3,12	100,00	312,00
40	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	kus	10,00	50,00	500,00
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady	%	38,36	2,00	76,72
Díl:	773	Podlahy teracové				3 912,72
41	773500910R00	Opravy teracových podlah vstup				
42	773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m2	1,00	500,00	500,00
43	r-pol	Příplatek za malý rozsah	m	1,00	100,00	100,00
44	r-pol	Broušení terac. podlahy	m2	1,00	500,00	500,00
45	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	m2	1,00	500,00	500,00
		Celkem za 773 Podlahy teracové	%	16,00	3,00	48,00
Díl:	784	Malby				1 648,00
46	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 4x	m2			

JVÝ rozpočet

Příloha č.2 smlouvy

Štavba :	P Nádražní 80	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Výměna výkladců - dřevěné	Stavební část - Dřevěné II

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
47	784195112R00 dotčená stěna: (0,2+3,18+0,25+0,23+2,49+0,97+0,33+2*1)*(3,35+2) Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	51,63		
	Celkem za 784 Malby		51,63	40,00	2 065,10
Díl: 48	787700803R00 Zasklívání Vysklívání výkladců skla plochého o pl. do 6 m2 20,193*2	m2	40,39	20,00	807,72
	Celkem za 787 Zasklívání		40,39		807,72
Díl: 49	799 r-pol Ostatní Vyřízení záboru prostranství	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za 799 Ostatní				500,00
Díl: 50	M21 r-pol Elektromontáže Demontáž části stávající elektroinstalace ukončení před výklady	kpl	1,00	800,00	800,00
	Celkem za M21 Elektromontáže				800,00
Díl: 51	D96 979081111R00 Přesuny sutí a vybouraných hmot Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,63	200,00	725,35
52	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,64	14,00	456,97
53	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,63	150,00	544,01
54	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,25	20,00	145,07
55	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,63	300,00	1 088,02
	Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 959,42

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:

**„Výměna stávajících dřevěných výkladců za nové dřevěné na ul.
Nádražní 694/80, Moravská Ostrava“**

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: **SLONKA s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 26852659
Zastoupený: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

(dodavatel doplní své identifikační údaje)

Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE: (v případě, že jsou již dodavateli známi)		Specifikace části veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele
†	Název:	
	Sídlo:	
	IČ:	

2.	Název:		
	Sídlo:		
	IČ:		
3.	Název:		
	Sídlo:		
	IČ:		

V Ostravě, dne 19.4.2017

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 26052659



Ing. Vladimír Slonka, jednatel

Seznam kontaktů zhotovitele:

Kontaktní osoba	Funkce	Telefon	Elektronická adresa
Ing. Vladimír Slonka	jednatel		

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 26652659

V Ostravě, dne 19.4.2017

Ing. Vladimír Slonka, jednatel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ
